

Alunos: Hudson Ribeiro Vaz dos Santos, Heloisa Alves Irie, Gabriel Feliciano da Silva, Matheus de Almeida Barão, Natalia Rezende da Luz.

SCRUM

1. BACKLOG

Backlog (7 tickets)

29

0

0

Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho

AVALIAR

TDT-1

B01 - Como Admin, quero fazer Login para acessar o sistema com segurança.

TAREFAS PENDENTES

3

TDT-2

B02 - Como Admin, quero Gerenciar Produtos (Cadastrar/Editar) para montar o cardápio.

TAREFAS PENDENTES

4

TDT-3

B03 - Como Cliente, quero Visualizar o Cardápio para escolher o que comer.

TAREFAS PENDENTES

4

TDT-4

B04 - Como Cliente, quero Fazer um Pedido selecionando itens.

TAREFAS PENDENTES

6

TDT-5

B05 - Como Cozinha, quero ver a Lista de Pedidos em tempo real.

TAREFAS PENDENTES

4

TDT-6

B06 - Como Entregador, quero Atualizar o Status do pedido para notificar o cliente.

TAREFAS PENDENTES

3

TDT-7

B07 - Como Gestor, quero ver um Relatório de Vendas simples.

TAREFAS PENDENTES

5

Criar

2. PRIMEIRA SPRINT

▼

Sprint 1 13 nov – 25 dez (3 tickets)

9

0

0

Concluir sprint

...

Estabelecer login e cadastro de produtos

✓

TDT-1

B01 - Como Admin, quero fazer Login para acessar o sistema com segurança.

TAREFAS PENDENTES ▼

3

✓

TDT-2

B02 - Como Admin, quero Gerenciar Produtos (Cadastrar/Editar) para montar o cardápio.

TAREFAS PENDENTES ▼

4

✓

TDT-8

Configuração do Banco de Dados

TAREFAS PENDENTES ▼


2

+ Criar


- **Duração da Sprint:** 15 dias (2 semanas).
- **Meta da Sprint 1:** "Estrutura Fundamental". O objetivo é ter o sistema rodando, com acesso seguro e dados (produtos) inseridos. Sem produtos, não há como fazer pedidos na Sprint 2.
- **Sprint Backlog (Itens selecionados):**
 - B01 - Login (3 pts)
 - B02 - Gerenciar Produtos (4 pts)
 - Configuração do Banco de Dados e Ambiente (Tarefa Técnica - 2 pts)
 - **Total comprometido:** 9 Pontos.

3. SIMULAÇÃO DA PRIMEIRA SPRINT

Dia 1 (Planning): A equipe se reuniu. O *Product Owner* explicou que o cadastro de produtos é a prioridade zero. O time de desenvolvimento quebrou as tarefas técnicas.

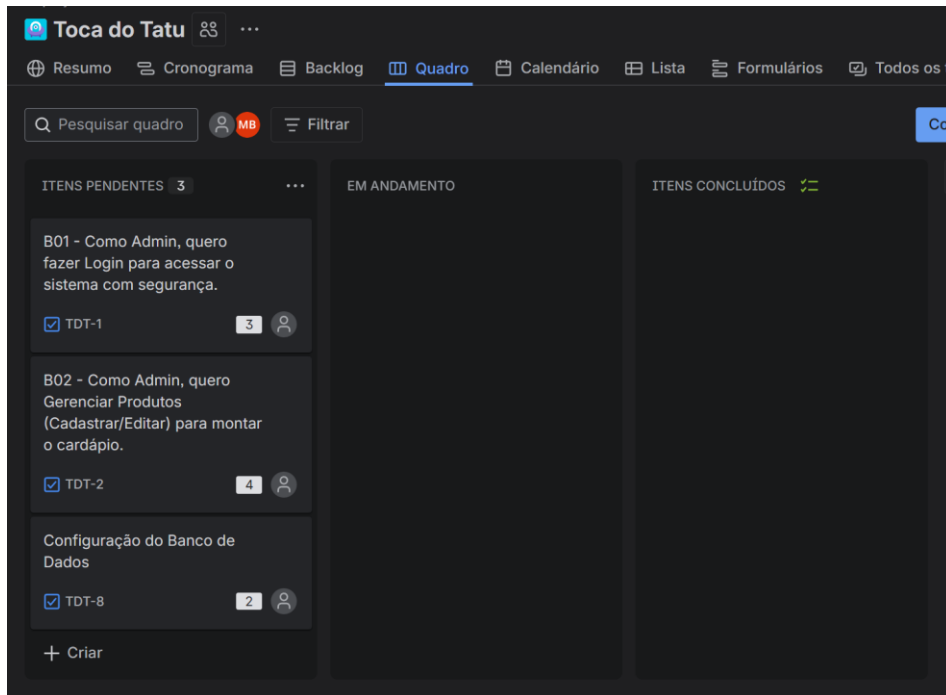


Dia 2 a 5 (Desenvolvimento): Início da configuração do banco de dados e início da equipe de Frontend para desenhar a tela de Login.

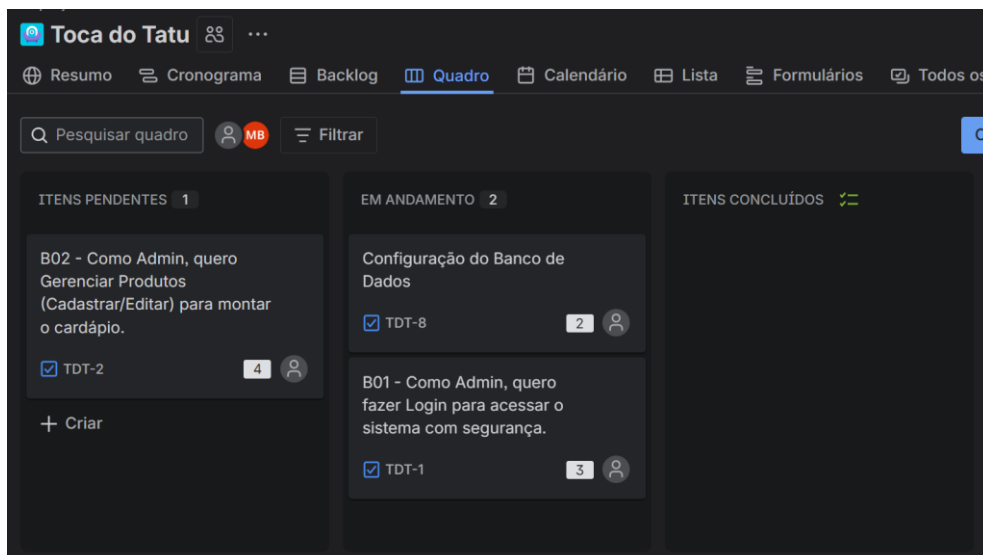


Dia 6 a 8 (Meio da Sprint): Banco de dados e login finalizados, início da tela de produtos.

Daily Scrum: A equipe percebeu que a validação de fotos dos pratos estava demorando mais que o previsto. Decidiram simplificar: nesta sprint, o produto não terá foto, apenas texto, para garantir a entrega.

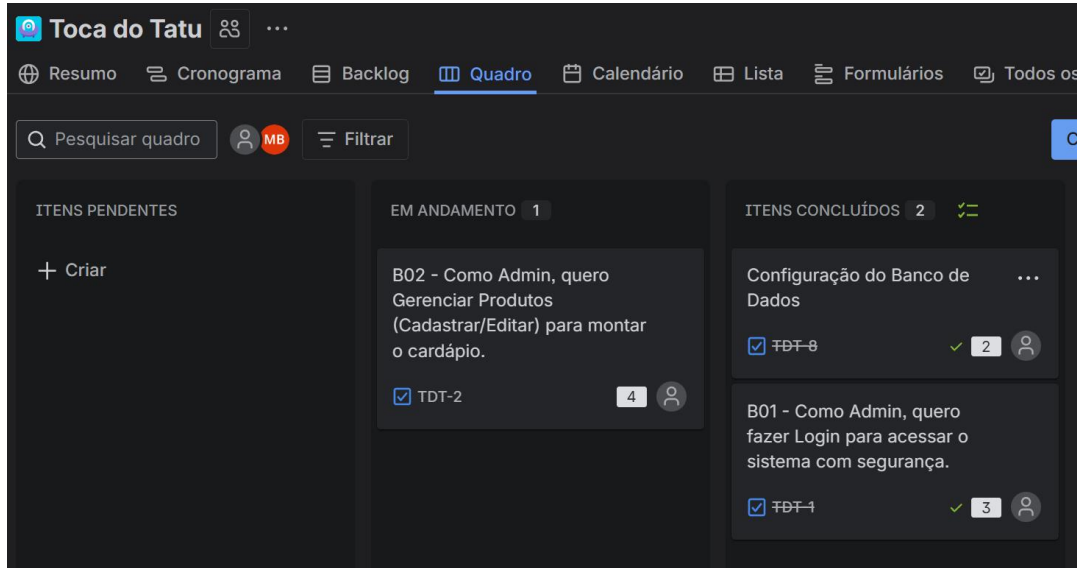


Dia 9 a 12 (Testes e Ajustes): O cadastro de produtos foi finalizado e testes mostraram um bug: era possível cadastrar preço negativo. O erro foi corrigido no dia 11.

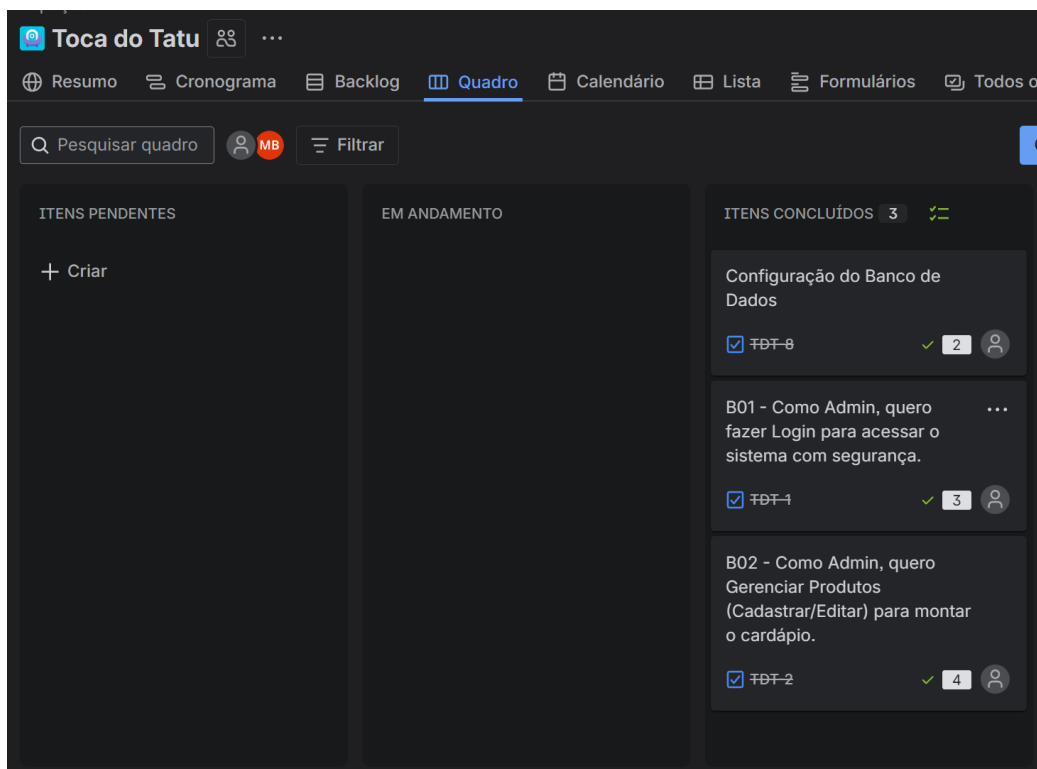

Dia 15 (Sprint Review & Retrospective): Review: O software foi apresentado e a meta foi atingida. **Retrospectiva:** O time pontuou que a configuração do ambiente demorou muito e precisa ser automatizada para a Sprint 2.

4. BURNDOWN CHART

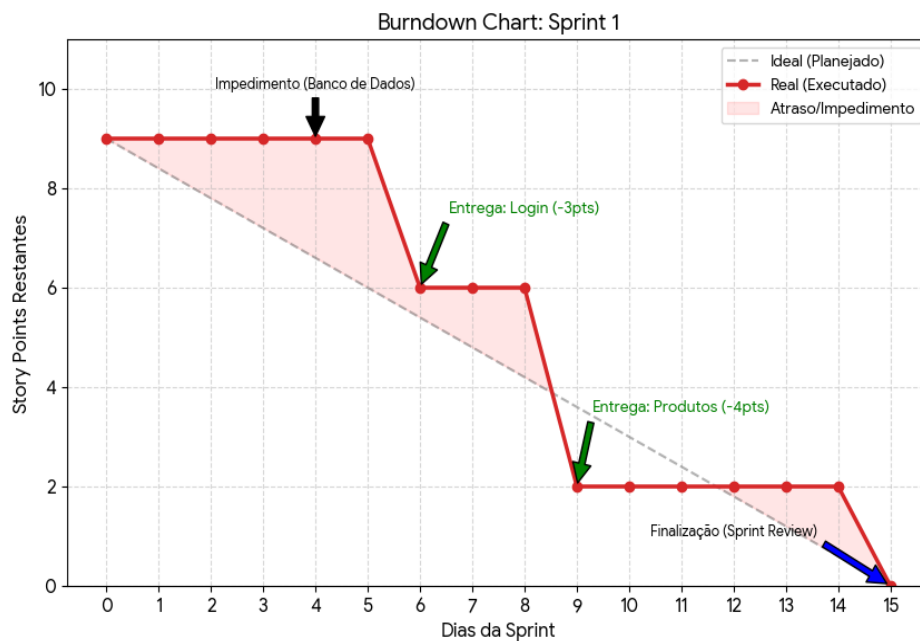

O gráfico demonstra o progresso da equipe durante os 15 dias da primeira Sprint. A linha vermelha (Real) permanece horizontal nos primeiros 5 dias devido a um impedimento técnico na configuração do banco de dados. As quedas bruscas no 6º e 9º dia representam, respectivamente, a conclusão das histórias de usuário "Login" e "Gerenciar Produtos". O projeto foi concluído dentro do prazo (dia 15), convergindo com a linha ideal (cinza).
